#	Titel	Vorgabe Arbeit
0	**120 OHM**	
1	Vergabe Architekten	
2	Vergabe Fachplaner	
3	**Schadstoffsanierung**	
4	Planung	4 Wochen
5	Leistungsverzeichnis	4 Wochen
6	Ausschreibung und Vergabe	
7	Baufreiheit Museum	
8	Ausführung	32 Wochen
9	**Fernwärme**	
10	Planung und Beauftragung	4 Wochen
11	Ausführung	16 Wochen
12	**Geothermie**	
13	Machbarkeitsstudie	6 Wochen
14	LP 4 Genehmigungsplanung	4 Wochen
15	LP 4 Genehmigungsphase	20 Wochen
16	LP 5 Ausführungsplanung	4 Wochen
17	LP 6 LV	2 Wochen
18	LP 7 Ausschreibung und Vergabe	3 Monate
19	LP 8 Ausführung	8 Wochen
20	**Stufe 1**	
21	LP 1 Grundlagen	8 Wochen
22	LP 2 Auftakt mit SNM	
23	LP 2 Vorentwurf	8 Wochen
24	**Stufe 2**	
25	LP 3 Planung	28 Wochen
26	LP 3 Kostenberechnung	6 Wochen
27	Kostenberechnung	
28	LP 4 Genehmigungsplanung	10 Wochen
29	LP 4 Genehmigungsphase	28 Wochen
30	**Stufe 3**	
31	LP 5 Rohbau	24 Wochen
32	LP 5 Ausbau	36 Wochen
33	LP 5 Außenraum	12 Wochen
34	LP 6 Rohbau	10 Wochen
35	LP 6 Ausbau	16 Wochen
36	LP 6 Außenraum	8 Wochen
37	LP 7 Rohbau	20 Wochen
38	LP 7 Ausbau	20 Wochen
39	LP 7 Außenraum	16 Wochen
40	**Bauzeit**	
41	**LP 8 Rohbau**	
42	LP 8 Rohbau LH	40 Wochen
43	LP 8 Rohbau WH	48 Wochen
44	**LP 8 Ausbau**	
45	LP 8 Ausbau LH	40 Wochen
46	LP 8 Ausbau WH	52 Wochen
47	Ausführungsbeginn Ausstellung	
48	**LP 8 Außenraum**	
49	LP 8 Außenraum	28 Wochen
50	LP 8 Mängel Abrechnung	20 Wochen
51	Schlusstermin Rechnungen	

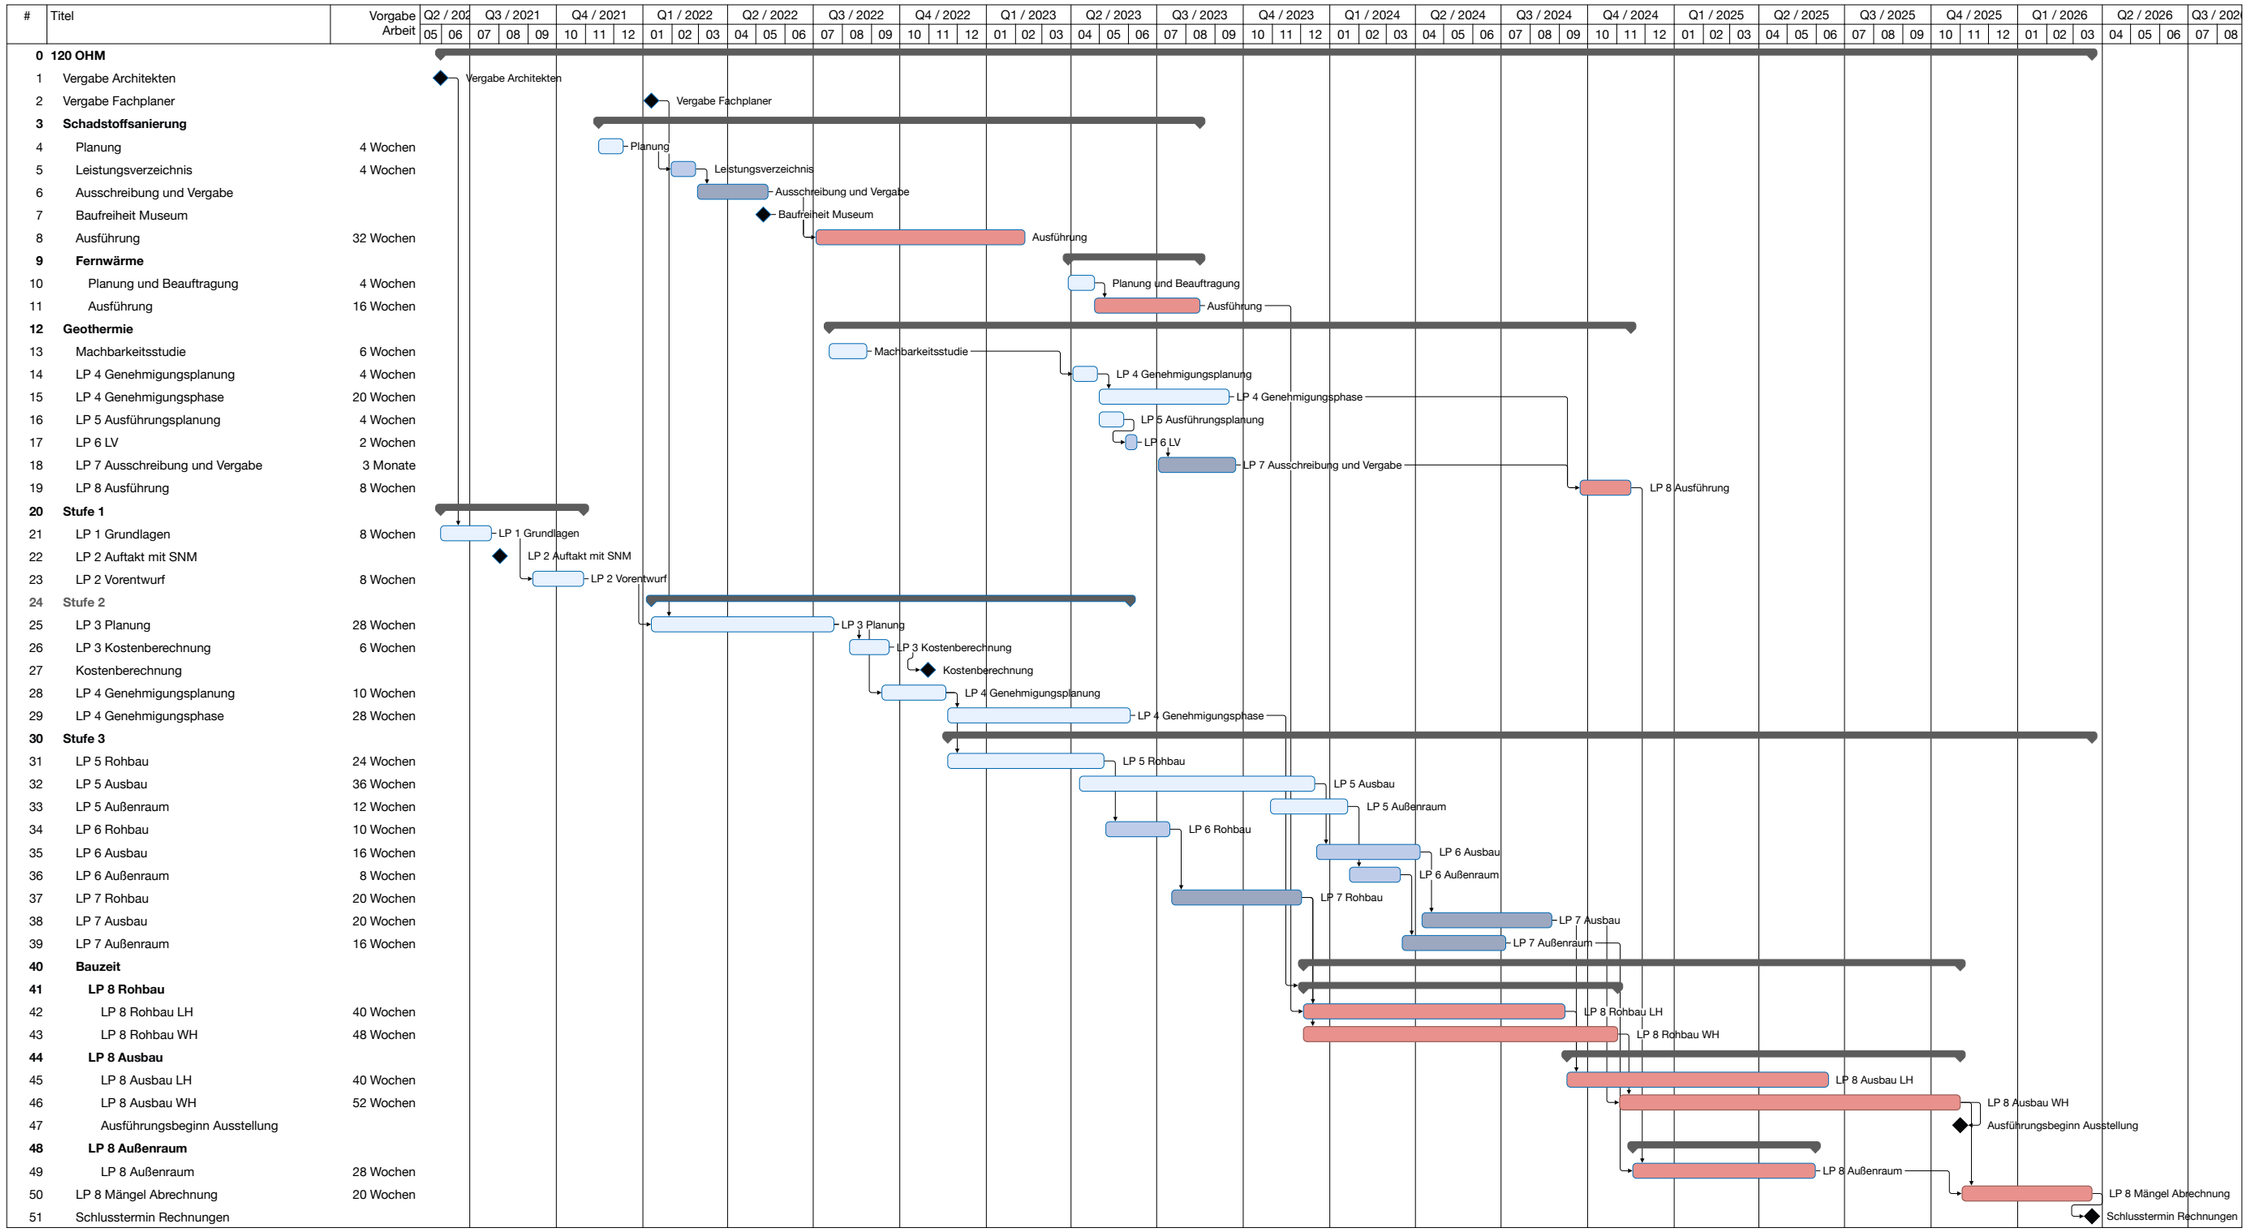

Studio Gründer Kirfel
Architekten PartBmbB

Schloss 1
98630 Bedheim

mail@gruenderkirfel.de
+49 3685 40 50 30
